

Kunde:
Marc und Cornelia Handtke
Römerstraße 44
54516 Wittlich


Standort:
Marc und Cornelia Handtke
Römerstraße 44
54516 Wittlich

Gesamtleistung:	8,09 Wp
Gesamtleistung WR	3 + 6 = 9 kW
Notstromumschaltung:	Nein
PV Point:	Nein




Luftbild nicht aktuell, Wintergarten ist neubau

Modulbelegung Wintergarten

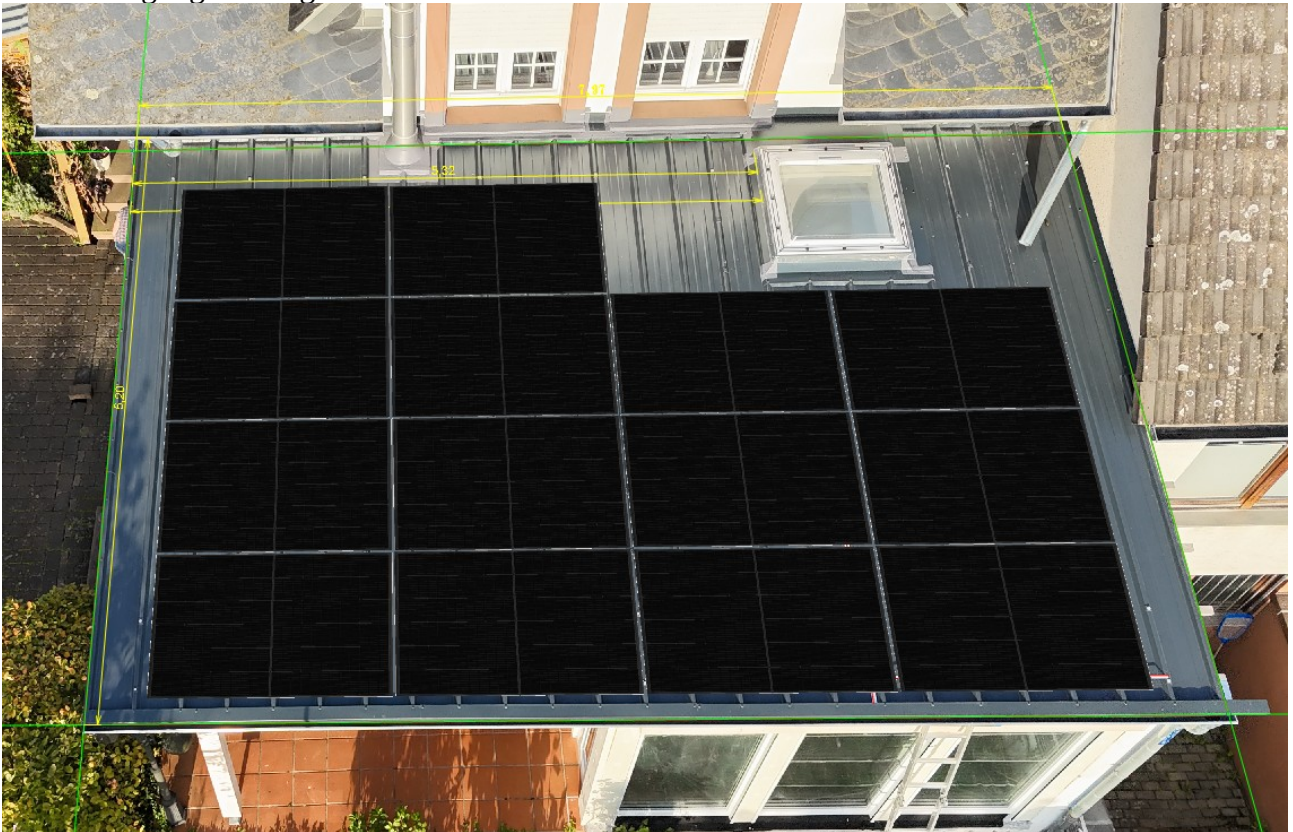


14 Stück Trina TSM-DE09.08 Vertex S Full Black 385W
in Landscape
Achtung Modulklemmbereich: 6 – 27 cm (15 cm),

Befestiger:

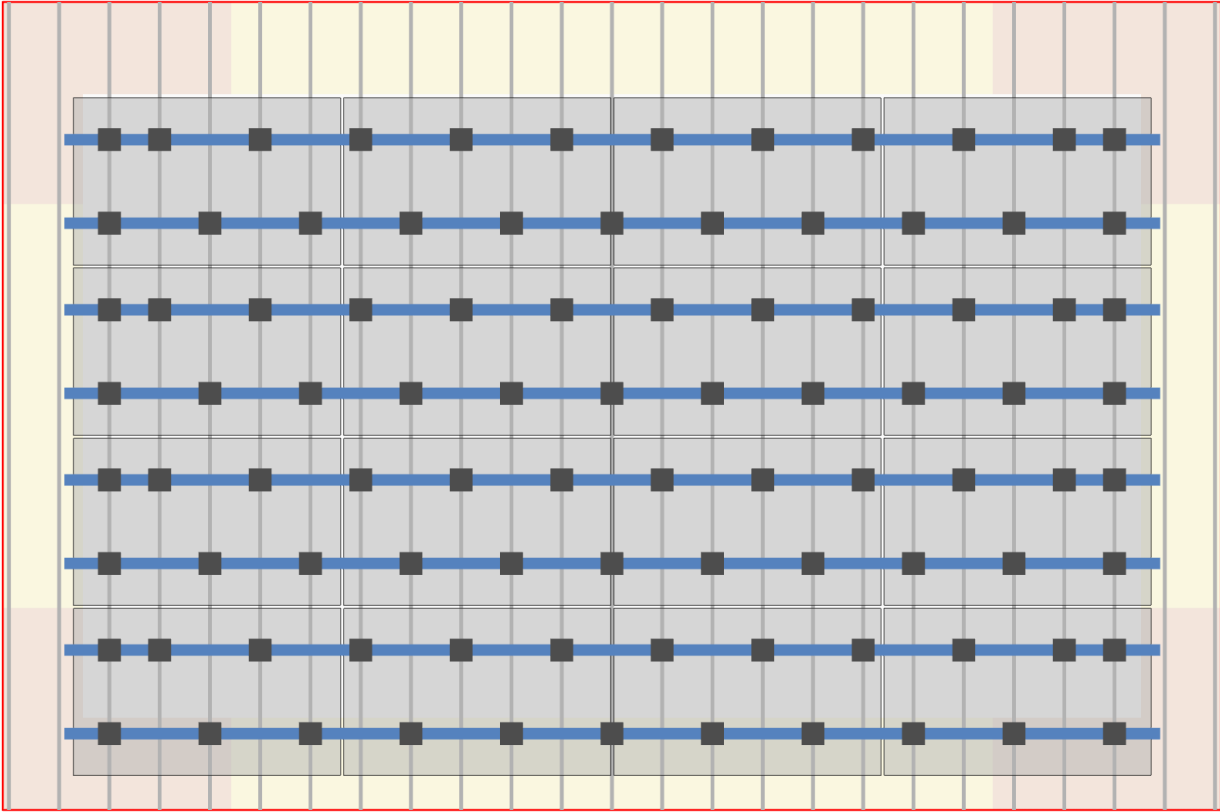

Strangplan Wintergarten

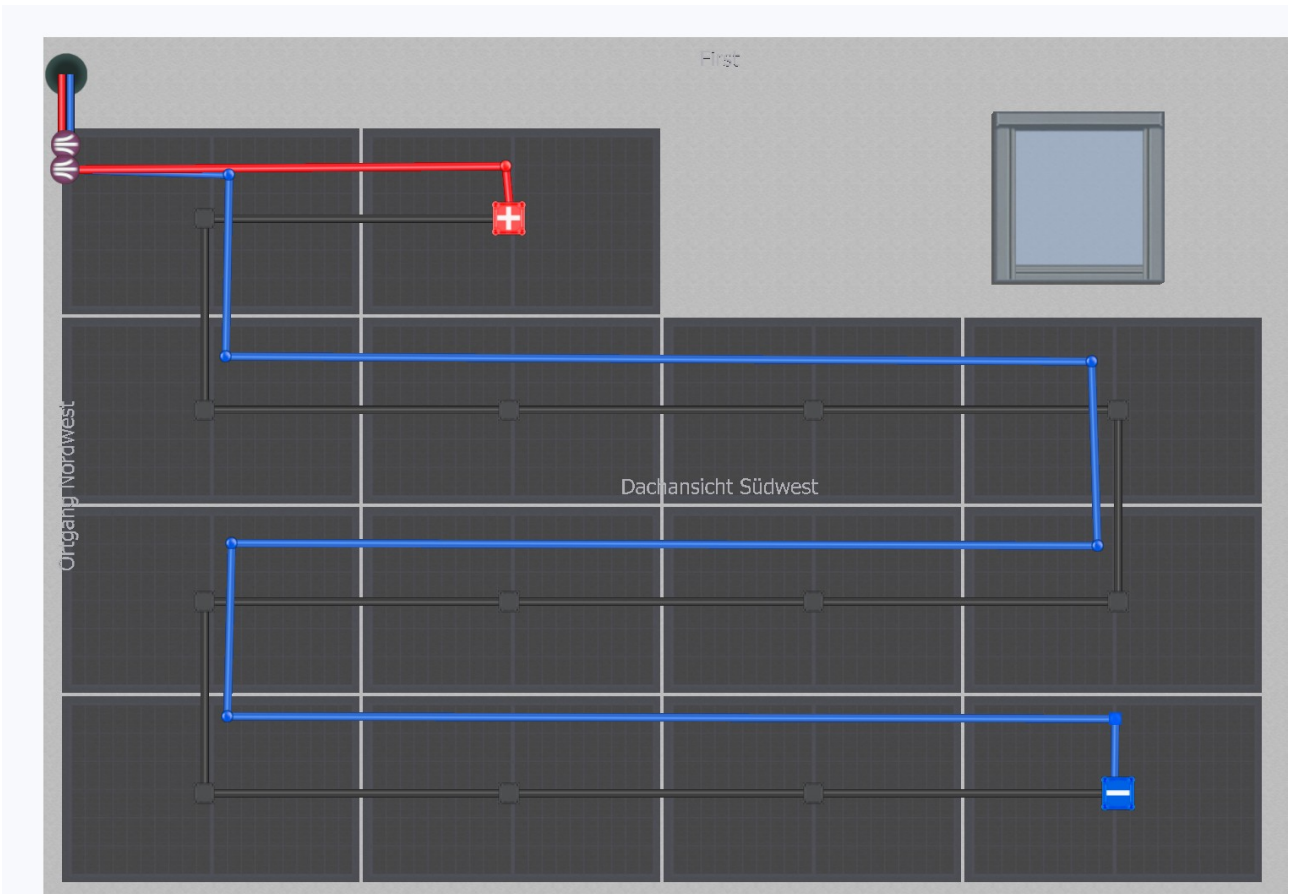

Strangkabel und Erdung sind seitlich über Ortgang (nahe First zu führen)

Schutzrohr verwenden!

Wird anschließend unter dem Dach wieder nach Innen geführt, dann senkrecht mit starrem Rohr bis Mitte Kellerfenster.


Minus Leitung mitführen, Stromschleifen sind zu vermeiden!




Traufhöhe 3,5 Meter

Modulbelegung Schuppen


1007_173614_0009_1696942381618_photo

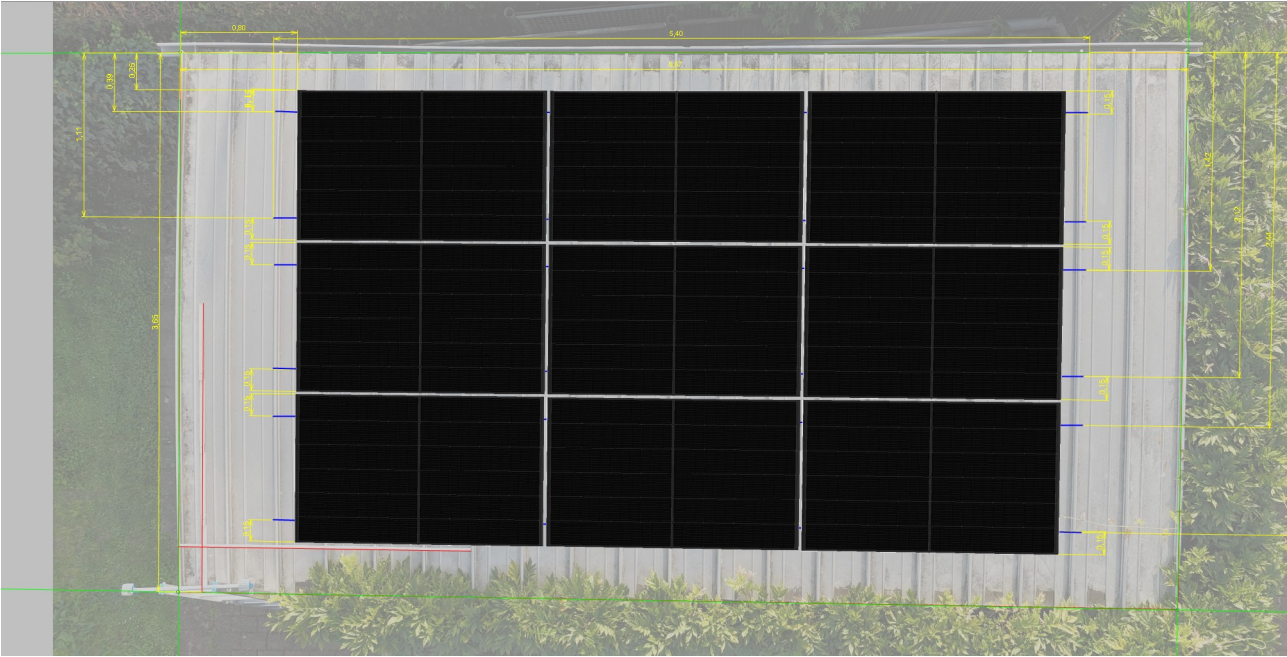

Stringplan

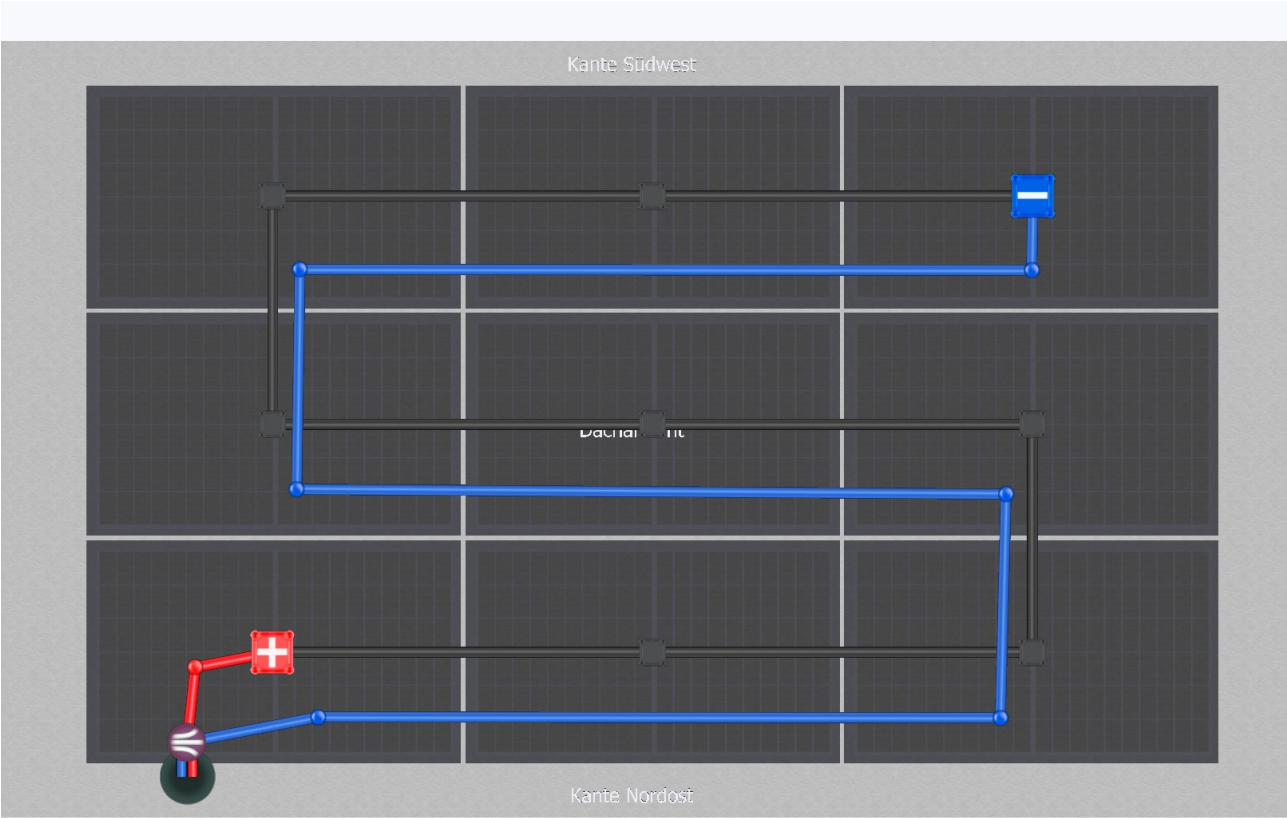

Befestiger:

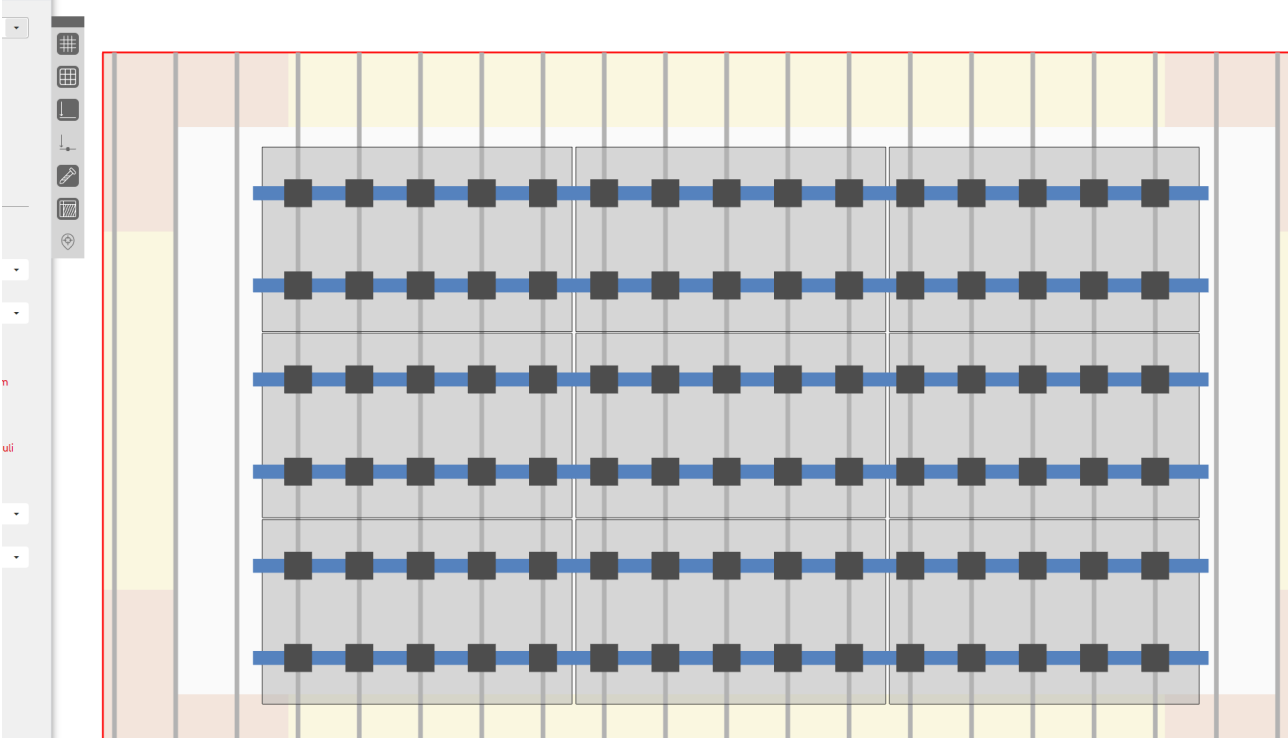



Stringkabel und Erdung mit Schutzrohr in Spalt zwischen Holzkonstruktion und Dach einführen.
Wechselrichter Standort direkt hinter der Tür auf der Rechten Seite
